PPA

PT PUTRA PERKASA ABADI

PROSEDUR

OVERBURDEN REMOVAL

PPA-ADRO-SOP-PRO-01

Dibuat Oleh	:	**Irwan A. Putra** **Group Leader**	**Tgl : 29/03/2026**
Ditinjau Oleh	:	**Fachrul Latuconsina** **Departement Head**	**Tgl : 29/03/2026**
Disetujui Oleh	:	**Wahyu Binuko** **Penanggung Jawab Operational**	**Tgl : 29/03/2026**

CATATAN REVISI

NO.	HALAMAN	URAIAN REVISI	TANGGAL
1.	01	Perubahan template prosedur	18 Juli 2023
2.	01	Perubahan template prosedur	07 September 2023
3.	01	Perubahan a. Pimpinan Departemen Dari Pak Mustofa ke Pak Fachrul Latuconsina b. PJO dari Pak Handy Sastradi Ke Pak Rodli Muhajir	24 Oktober 2024
4.	01	Perubahan PJO dari Pak Rodli Muhajir Ke Pak Wahyu Binuko	01 Desember 2025
5.	03	Penambahan ketentuan PAF dan NAF	29 Desember 2025
6.	03	Penambahan Jarak Parkir di Front Loading dan Disposal	29 Maret 2026

A. TUJUAN

1. Memberikan pedoman untuk dapat melakukan proses kegiatan yang berhubungan dengan overburden removal.
2. Memberikan pedoman untuk mengontrol proses kegiatan yang berhubungan dengan overburden removal.
3. Memberikan pedoman proses pelaksanaan kegiatan overburden bisa berjalan secara optimal, efektif dan efisien.
4. Memastikan pelaksanaan proses kegiatan overburden berjalan sesuai dengan standar dan peraturan lain yang berlaku.

B. RUANG LINGKUP

Prosedur ini dipergunakan sebagai penerapan system manajemen terintegrasi K3PLM dan prosedur overburden removal yang di implementasikan pada area kerja PT. Putra Perkasa Abadi

C. REFERENSI

1. PP No. 50 Tahun 2012, Tentang Penerapan SMK3
2. Kepmen ESDM No. 1827 Tahun 2018 Elemen IV.1 Pelaksanaan Pengendalian Operasional
3. KepDirjen MINERBA No, 185.K/37.04/DJB/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan dan Mineral
4. ISO 9001 : 2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
5. ISO 14001: 2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
6. ISO 45001 : 2018 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
7. ISO 50001 : 2018 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
8. PPA-HO-MAN-COE-001 - Manual Sistem Manajemen Terintegrasi
9. WIN-AI-IMS-21-005 Kegiatan Penilaian Good Mining Practice Aspek Teknis Pertambangan

D. DEFINISI

1. Overburden adalah tanah / batuan yang berada diatas (menutupi) lapisan batubara.
2. Loading Point adalah area / lokasi pemuatan dan pengambilan material Overburden.
3. Dumping Point adalah area / lokasi penimbunan material Overburden.

E. AKTIFITAS DAN TANGGUNG JAWAB

No.	Aktifitas	Dokumen / Catatan	P I C
1.	**Persiapan :** a. Departemen produksi. menerima rencana *OB Removal* dari Engineering b. Rencana tersebut diberikan *Mine Plan (Engineering)* dalam bentuk rencana mingguan dan rencana bulanan.	▪ *Monthly plan* ▪ *Weekly plan* ▪ *Daily Plan* ▪ *Perintah Kerja Harian (PPA-*	*Mine Plan & Survey Section* *Group Leader*

	c. Rencana mingguan / bulanan yang telah diterima dipelajari kemudian melakukan pengasetan alat dan personil berdasarkan ketersediaan alat, personil dan waktu pelaksanaannya. d. *Tim Survey (Engineering)* melakukan pengukuran dan pemasangan batas-batas pemotongan sebagai petunjuk kerja OB *Removal*. Ditandai dengan menggunakan pita berwarna. e. Departemen Produksi membuat detail pekerjaan melalui Perintah Kerja Harian yang mengacu ke daily plan. Unit untuk kegiatan over burden removal WAJIB melakukan P2H (Pemeriksaan dan Pemeliharaan Harian) dan berstatus RFU (*Ready For Use*).	*ADRO-F-PRO-15B)* ▪ *Form P2H Dozer (PPA-ADRO-F-SHE-41D)* ▪ *Form P2H Bulldozer (PPA-ADRO-F-SHE-41D)* ▪ *Form P2H Excavator (PPA-ADRO-F-SHE-41F)* ▪ *Form P2H Heavy Dump Truck (PPA-ADRO-F-SHE-41E)*	
2.	**Pembentukan Area Loading :** a. Departemen produksi melakukan persiapan kegiatan OB *Removal PAF dan NAF* dengan persiapan awal membuat lokasi pemuatan *(loading point)* b. Sebelum dilakukan pembentukan front loading dilakukan inspeksi terlebih dahulu. c. Pembentukan Front Loading mengacu kepada aspek Good Mining Practice yang meliputi : - Tinggi Jenjang Penggalian - Kondisi Lantai kerja - Drainase Air permukaan - Batas Penggalian - Luasan Area Penggalian - Terdapat Grade Box dan Label PAF NAF/ Alat Kontrol Elevasi - Kondisi material OB sisa floor batubara atau spoil - Penerangan untuk Shift malam - Patok acuan kemiringan lereng final design - Perapian dinding lereng final atau Dinding penggalian temporary - Tanggul Pengaman / Bundwall	▪ *Form Checklist Inspeksi Area Pit (PPA-ADRO-F-PRO-01A)* ▪ *Form Checklist Daily Activity Loading Lumpur (PPA-ADRO-F-PRO-01D)* ▪ *Form Checklist Inspeksi Area Loading Material Lumpur (PPA-ADRO-F-PRO-01E)* ▪ *IK Pembuatan Loading Point OB (PPA-ADRO-IK-PRO-12)* ▪ *SP Front (PPA-ADRO-SP-PRO-01)*	*GL Produksi*

3.	**Pembentukan Area Disposal :** a. Departemen produksi melakukan persiapan kegiatan OB *Removal* dengan persiapan awal membuat lokasi penimbunan *(dumping point)* b. Sebelum dilakukan pembentukan dumping point / disposal dilakukan inspeksi terlebih dahulu. c. Pembentukan Disposal/ dumping point mengacu kepada aspek Good Mining Practice yang meliputi : - Dozer Support - Tinggi Jenjang Penimbunan - Kondisi lantai kerja penimbunan - Drainase Air Permukaan - Batas Penimbunan - Luasan Area Penimbunan - Grade Box dan Label PAF & NAF/ Alat Kontrol Elevasi - Material Sisa Penimbunan, Material Fee Dump - Tanggul Pembatas Timbunan / windrow - Kestabilan Lereng Penimbunan - Penerangan untuk shift malam - Rambu – Rambu dumping point - Pos Pengawas - Tempat Parkir Sarana	▪ *Form Checklist Inspeksi Area Dumping Overburden (PPA-ADRO-F-PRO-01B)* ▪ *Form Checklist Inspeksi Dumping OB di area kritis (PPA-ADRO-F-PRO-01C)* ▪ *IK Pembuatan Dumping Material Over Burden (PPA-ADRO-IK-PRO-25)* ▪ *SP Disposal (PPA-ADRO-SP-PRO-02)*	*GL Produksi*
4	**Pembentukan Jalan Angkut Material OB Ke Arah Front :** a. Untuk persiapan pemuatan dan pengangkutan, di buatkan jalan mengarah ke front loading dengan lebar **3½** x Lebar alat angkut terbesar b. Pada muara jalan yang bersimpangan dengan dipasang pemisah jalur (separator) dengan tinggi paling kurang setengah diameter roda kendaraan terbesar (**1.35 m**) dan lebar bagian atas median paling kurang sama dengan lebar roda kendaraan terbesar (**0,75 m**), dan panjang median **5 m .**	▪ *IK Pembuatan Jalan Tambang (PPA-ADRO-IK-PRO-08)* ▪ *SP Jalan Angkut (PPA-ADRO-SP-PRO-03)*	• *Operator* • *GL Produksi*
5	**Loading material *over burden* :** a. Departemen produksi melakukan pemuatan *Over Burden* dengan *excavator* - PC 395 – Class = 3,5 Menit – 9 Bucket - PC 1250 – Class = 3,5 Menit – 9 Bucket - PC 2000 – Class = 2,5 Menit – 5 Bucket	▪ *Form Time Sheet Alat Produksi (PPA-ADRO-F-ENG-42)* ▪ *Form Observasi Ketidak Tercapaian Productivity (PPA-*	• *Operator* • *GL Produksi*


	b. Muatan OB minimal **108 Ton** , case tertentu muatan akan di atur tersendiri dengan melakukan koordinasi dengan tim engginering. c. Sudut swing pada saat loading **45°** d. Manuver unit hauler searah jarum jam, jika tidak memungkinkan arah manuver bisa dirubah dengan persetujuan dari atasan dan dilakukan pengawasan melekat. e. Setiap unit A2B Wajib menjaga jarak aman minimal **50 meter** saat berhenti/antri/parkir dari posisi unit kendaraan / alat berat yang sedang beroperasi di area front loading dan berada di luar badan jalan aktif lalu lintas kendaraan/ alat berat kecuali unit dozer support loading point. f. Pada saat antri di front loading EST (*Empty Stop Time*) Maksimal **1,5 Menit**. g. Pada front loading overburden PAF maupun NAF , Loader dan Hauler wajib memasang tanda material pada unit masing – masing	*ADRO-F-PRO-15A)* ▪ *Form Checklist Inspeksi Area Pit (PPA-ADRO-F-PRO-01A)* ▪ *Form Checklist Inspeksi Area Loading Material Lumpur (PPA-ADRO-F-PRO-01E)* ▪ *Form Checklist Inspeksi Area Loading Material Lumpur (PPA-ADRO-F-PRO-01E)* ▪ *IK Mengoperasikan Excavator (PPA-ADRO-IK-ACD-06)* ▪ *IK Mengoperasikan Heavy Duty (PPA-ADRO-IK-ACD-10)* ▪ *IK Loading Material Lumpur (PPA-ADRO-IK-PRO-15)* ▪ *IK Loading Material Pasir (PPA-ADRO-IK-PRO-16)* ▪ *IK Loading Material Gambut (PPA-ADRO-IK-PRO-18)*	
6	**Peraturan Jarak Parkir Pada Area Front Loading dan Disposal** a. Setiap kendaraan/ alat berat wajib menjaga jarak aman minimal 50 meter saat berhenti / antri parkir dari posisi unit kendaraan / alat berat yang sedang beroperasi pada area loading point maupun disposal. b. Jarak antri saat loading adalah 1 x panjang unit hauler **c.** Dan Jarak Dumping Antar unit adalah 1 x lebar unit hauler		• *Operator* • *GL Produksi*

7	**Pengangkutan Material Over Burden :** a. Departemen produksi. melakukan pengangkutan material *over burden* dengan menggunakan Heavy Dump Truck dari Pit Menuju Disposal b. Unit yang melakukan pengangkutan material over burden di batasi kecepatannya : - Jalan angkut lurus maksimal **40 Km/Jam.** - Jalur persimpangan jalan angkut tambang maksimal **30 Km/Jam**. - Jalan angkut tikungan **≥ 90°** atau di jalan switch back dibatasi kecepatan maksimal **20 Km/Jam.** c. Unit yang melakukan pengangkutan material over burden wajib menjaga jarak aman : - **40 meter** pada jalan datar dan menjak - **80 meter** pada jalan turunan - **50 meter** pada saat parkir antri di front loading. d. Operator unit pengangkut over burden wajib melakukan komunikasi aktif 2 arah selama beropeasi di jalan angkut khususnya di area persimpangan jalan, di area penyempitan jalan, atau saat akan mendahului unit lain.	▪ *Form Time Sheet Alat Produksi (PPA-ADRO-F-ENG-42)* ▪ *Form Observasi Ketidak Tercapaian Productivity (PPA-ADRO-F-PRO-15A)* ▪ *IK Mengoperasikan Heavy Duty (PPA-ADRO-IK-ACD-10)*	• *Operator* • *GL Produksi*
8	**Dumping material overburden:** a. Lokasi dumping di sesuikan dengan plan dari engginering. - Material Overburden PAF Wajib di dumping ke disposal PAF yang telah di sediakan. - Material Overburden NAF Wajib di dumping ke dipsoal NAF yang telah di sediakan. b. Wajib komunikasi aktif 2 arah kepada pengawas area disposal dan unit lain pada area disposal. c. Setiap unit A2B Wajib menjaga jarak aman minimal **50 meter** saat berhenti/antri/parkir dari posisi unit kendaraan / alat berat yang sedang beroperasi di area dumping point dan berada di luar badan jalan aktif lalu lintas kendaraan/ alat berat kecuali unit dozer support dumping point. d. Semua kendaraan / alat berat yang beroperasi di area dumping point disposal dibatasi pada kecepatan **Maksimal adalah 20 km/jam.** e. Didalam pendorongan material menggunakan unit	▪ *Form Time Sheet Alat Produksi (PPA-ADRO-F-ENG-42)* ▪ *Form Observasi Ketidak Tercapaian Productivity (PPA-ADRO-F-PRO-15A)* ▪ *Form Checklist Inspeksi Disposal (PPA-ADRO-F-PRO-01B)* ▪ *Form Checklist Inspeksi Dumping OB Di Area Kritis (PPA-ADRO-F-PRO-01C)* ▪ *IK Mengoperasikan Heavy Duty (PPA-ADRO-IK-ACD-10)*	• *Operator* • *GL Produksi*

	dozer dilakukan bergerak secara maju mundur sesuai arah dumping dan berpindah posisi ke tempat lain setelah area sekitar tidak ada aktivitas dumping oleh unit heavy duty.	▪ *IK Mengoperasikan Dozer (PPA-ADRO-IK-ACD-07)*	
9	**Dumping Material Lumpur :** a. Dumping material lumpur harus dibuatkan pad dumping dengan nilai **CBR 33%** b. Wajib komunikasi aktif 2 arah kepada pengawas area disposal dan unit lain pada area disposal lumpur. c. Setiap unit A2B Wajib menjaga jarak aman minimal **50 meter** saat berhenti/antri/parkir dari posisi unit kendaraan / alat berat yang sedang beroperasi di area dumping point dan berada di luar badan jalan aktif lalu lintas kendaraan/ alat berat kecuali unit dozer support dumping point. d. Semua kendaraan / alat berat yang beroperasi di area dumping point disposal dibatasi pada kecepatan **Maksimal adalah 20 km/jam.** e. Pengawasan pada area dumping lumpur bersifat melekat.	▪ *IK Dumping Lumpur (PPA-ADRO-IK-PRO-105)*	• *GL Produksi* • *Operator*

F. LAMPIRAN

1. Diagram Alir

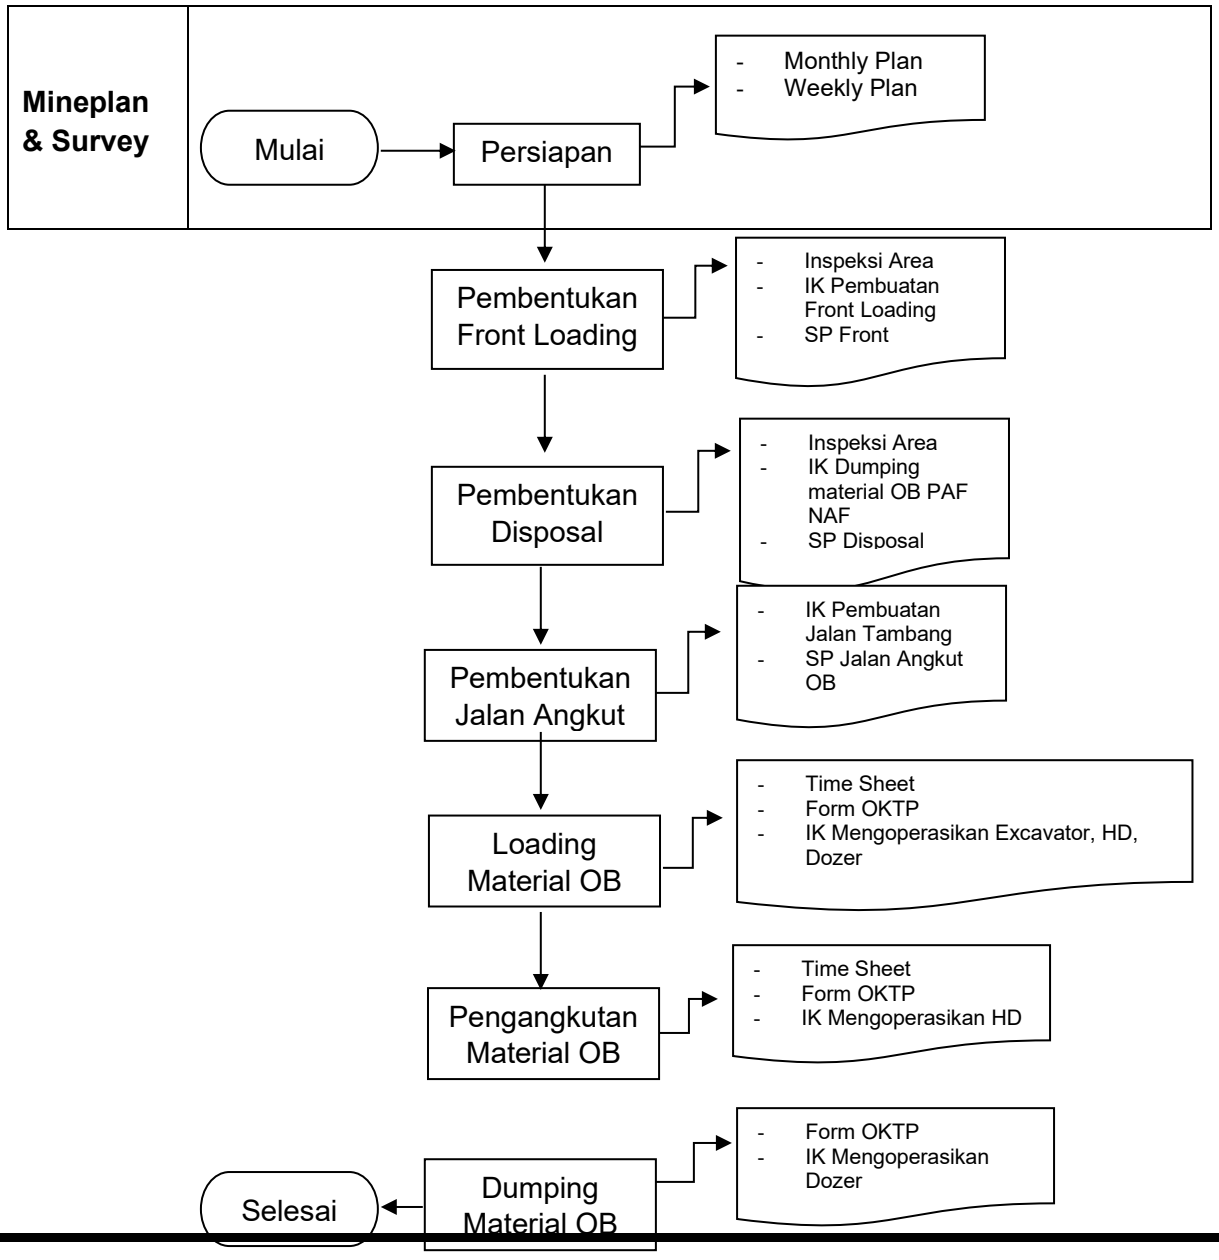

Group Leader Produksi	↓

2. Formulir

2.1. PPA-ADRO-F-PRO-01A Form Checklist Inspeksi Area Pit (Front Loading)
2.2. PPA-ADRO-F-PRO-01B Form Checklist Inspeksi Disposal
2.3. PPA-ADRO-F-PRO-01C Form Checklist Inspeksi Dumping OB Di Area Kritis
2.4. PPA-ADRO-F-PRO-01D Form Checklist Daily Activity Loading Lumpur
2.5. PPA-ADRO-F-PRO-01E Form Checklist Inspeksi Area Loading Material Lumpur
2.6. PPA-ADRO-F-PRO-15A Observasi Ketidaktercapaian Productivity

2.7. PPA-ADRO-F-PRO-15B Perintah Kerja Harian
2.8. PPA-ADRO-F-SHE-41D Form P2H Bulldozer
2.9. PPA-ADRO-F-SHE-41E Form P2H Heavy Dump Truck
2.10. PPA-ADRO-F-SHE-41F Form P2H Excavator
2.11. PPA-ADRO-F-ENG-42 Form Time Sheet Alat Produksi
