PPA

PT PUTRA PERKASA ABADI

PROSEDUR

PENGELOLAAN MATERIAL N1

PPA-ADRO-SOP-PRO-27

Dibuat Oleh	: **Irwan A. Putra** **Group Leader**	**Tgl : 01/12/2025**
Ditinjau Oleh	: **Fachrul Latuconsina** **Departement Head**	**Tgl : 01/12/2025**
Disetujui Oleh	: **Wahyu Binuko** **Penanggung Jawab Operational**	**Tgl : 01/12/2025**

CATATAN REVISI

NO.	HALAMAN	URAIAN REVISI	TANGGAL
1	01	Perubahan PJO dari Pak Rodli Muhajir ke Pak Wahyu Binuko	01 Desember 2025

A. TUJUAN

1. Memberikan pedoman untuk dapat melakukan proses kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan material N1.
2. Memberikan pedoman untuk mengontrol proses kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan material N1.
3. Memberikan pedoman proses pelaksanaan kegiatan pengelolaan material N1 bisa berjalan secara optimal, efektif dan efisien.
4. Memastikan pelaksanaan proses kegiatan pengelolaan material N1 berjalan sesuai dengan standar dan peraturan lain yang berlaku.

B. RUANG LINGKUP

Prosedur ini dipergunakan sebagai penerapan system manajemen terintegrasi K3PLM dan prosedur pengelolaan material N1 yang di implementasikan pada area kerja PT. Putra Perkasa Abadi

C. REFERENSI

1. PP No. 50 Tahun 2012, Tentang Penerapan SMK3
2. Kepmen ESDM No. 1827 Tahun 2018 Elemen IV.1 Pelaksanaan Pengendalian Operasional
3. KepDirjen MINERBA No, 185.K/37.04/DJB/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan dan Mineral
4. ISO 9001 : 2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
5. ISO 14001: 2015 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
6. ISO 45001 : 2018 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
7. ISO 50001 : 2018 Klausul 8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasional
8. PPA-HO-MAN-COE-001 - Manual Sistem Manajemen Terintegrasi
9. WIN-AI-IMS-21-005 Kegiatan Penilaian Good Mining Practice Aspek Teknis Pertambangan

D. DEFINISI

1. Material N1 adalah good material yang didatangkan dari luar area pit wara.
2. Loading Point adalah area / lokasi pemuatan dan pengambilan material N1.
3. Dumping Point adalah area / lokasi penimbunan material N1.

E. AKTIFITAS DAN TANGGUNG JAWAB


No.	Aktifitas	Dokumen / Catatan	P I C
1.	**Persiapan :** a. Departemen produksi. menerima rencana *maintenance road dari dept engineering.* b. Rencana tersebut diberikan *Mine Plan (Engineering)* dalam bentuk rencana mingguan dan rencana bulanan.	▪ *Monthly plan* ▪ *Weekly plan* ▪ *Daily Plan* ▪ *Perintah Kerja Harian (PPA-*	*Mine Plan & Survey Section* *Group Leader*

	c. Rencana mingguan / bulanan yang telah diterima dipelajari kemudian melakukan pengasetan alat dan personil berdasarkan ketersediaan alat, personil dan waktu pelaksanaannya. d. Departemen Produksi membuat detail pekerjaan melalui Perintah Kerja Harian yang mengacu ke daily plan. e. Unit untuk kegiatan pengelolaan material N1 WAJIB melakukan P2H (Pemeriksaan dan Pemeliharaan Harian) dan berstatus RFU (*Ready For Use*). f. Kegiatan Pengelolaan Material N1 yang dilaksanakan pada **malam hari / night shift** wajib tersedia pencahayaan dengan nilai ambang batas : - Disposal (Lokasi Dumping) 3 Lux radius 100 Meter - Front Loading 5 Lux radius 50 Meter	*ADRO-F-PRO-15B)* ▪ *Form P2H Dozer (PPA-ADRO-F-SHE-41D)* ▪ *Form P2H Bulldozer (PPA-ADRO-F-SHE-41D)* ▪ *Form P2H Excavator (PPA-ADRO-F-SHE-41F)* ▪ *Form P2H Dump Truck (PPA-ADRO-F-SHE-41L)*	
2.	**Pembentukan Area Loading Pada Stok Material N1:** a. Departemen produksi melakukan persiapan kegiatan pengelolaan material N1 dengan persiapan awal membuat lokasi pemuatan *(loading point)* b. Sebelum dilakukan pembentukan front loading dilakukan inspeksi terlebih dahulu. c. Pembentukan Front Loading mengacu kepada aspek Good Mining Practice yang meliputi : - Tinggi Jenjang Penggalian - Kondisi Lantai kerja - Drainase Air permukaan - Luasan Area Penggalian - Penerangan untuk Shift malam - Tanggul Pengaman / Bundwall	▪ *Form Checklist Inspeksi Area Pit (PPA-ADRO-F-PRO-01A)* ▪ *IK Pembuatan Loading Point OB (PPA-ADRO-IK-PRO-12)* ▪ *SP Front (PPA-ADRO-SP-PRO-01)*	*GL Produksi*
3	**Pengangkutan Material N1 :** a. Departemen produksi. melakukan pengangkutan material *N1* dengan menggunakan Dump Truck (20 ton) dari stock area N1 Menuju titik dumping pada area jalan yang sudah ditentukan b. Unit yang melakukan pengangkutan material N1 melalui 2 akses : - Akses dari Stock N1 Menuju Pit melalui Jalur	▪ *Form Time Sheet Alat Produksi (PPA-ADRO-F-ENG-42)* ▪ *IK Mengoperasikan DT (PPA-ADRO-IK-PRO-114)*	• *Operator* • *GL Produksi*

	Hauling - Akses dari Jalur Hauling Menuju titik area penimbunan melalui Jalur Pit c. Operator unit pengangkut over burden wajib melakukan komunikasi aktif 2 arah selama beropeasi di jalan angkut khususnya di area persimpangan jalan, di area penyempitan jalan, atau saat akan mendahului unit lain.		
4	**Dumping material N1 :** a. Lokasi dumping di tentukan sesuai dengan plan maintenance jalan b. Wajib komunikasi aktif 2 arah kepada pengawas area disposal dan unit lain pada area disposal. c. Area dumping berada pada area road maintenance yang diatur **PPA-ADRO-SP-PRO-11 Road Construction & Road Maintenance** d. Semua kendaraan / alat berat yang melewati area maintenance dan dumping material N1 dibatasi pada kecepatan **Maksimal adalah 20 km/jam.** e. Didalam pendorongan material menggunakan unit dozer dilakukan bergerak secara maju mundur sesuai arah dumping dan berpindah posisi ke tempat lain setelah area sekitar tidak ada aktivitas dumping oleh unit dump truck atau pendorongan dilakukan bergantian dengan proses dumping material N1.	▪ *Form Time Sheet Alat Produksi (PPA-ADRO-F-ENG-42)* ▪ *IK Mengoperasikan Dump Truck (PPA-ADRO-IK-PRO-114)* ▪ *IK Mengoperasikan Dozer (PPA-ADRO-IK-PRO-112)*	• *Operator* • *GL Produksi*

F. LAMPIRAN

1. Diagram Alir

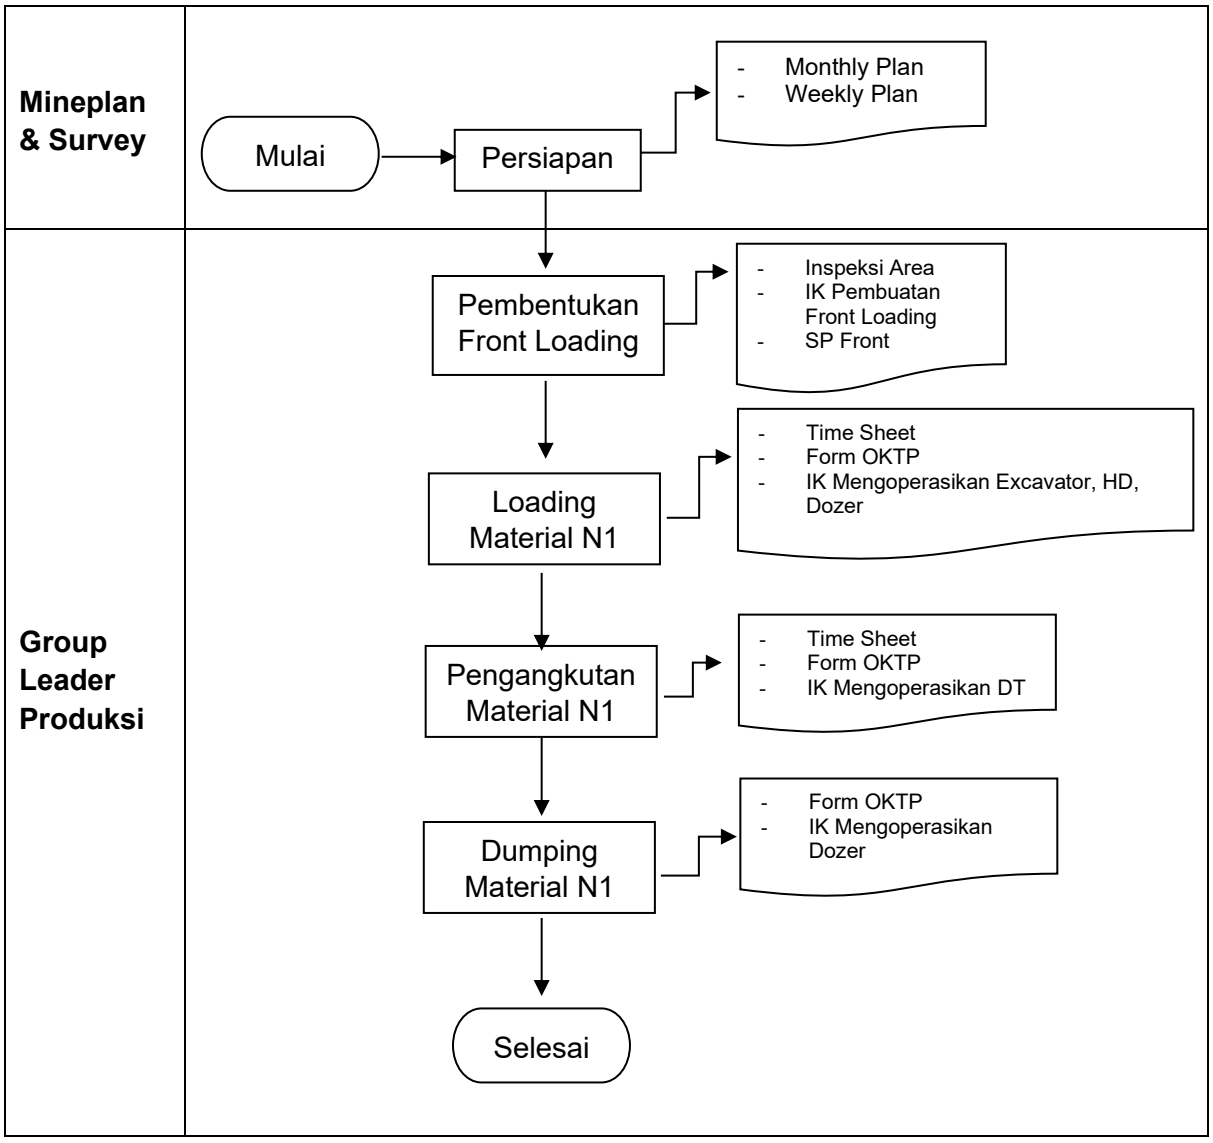

2. Formulir

2.1. PPA-ADRO-F-PRO-01A Form Checklist Inspeksi Area Pit (Front Loading)
2.2. PPA-ADRO-F-PRO-15B Perintah Kerja Harian
2.3. PPA-ADRO-F-SHE-41D Form P2H Bulldozer
2.4. PPA-ADRO-F-SHE-41L Form P2H Dump Truck
2.5. PPA-ADRO-F-SHE-41F Form P2H Excavator
2.6. PPA-ADRO-F-ENG-42 Form Time Sheet Alat Produksi
