PPA

PT PUTRA PERKASA ABADI

INSTRUKSI KERJA

LOADING MATERIAL LUMPUR


PPA-ADRO-IK-PRO-15

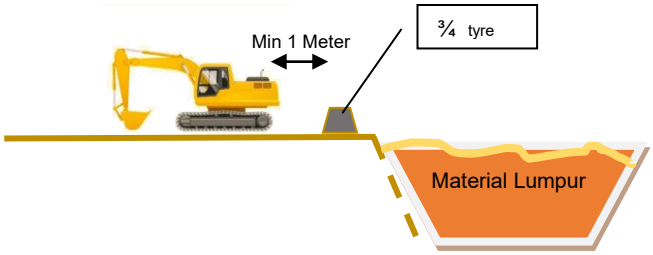
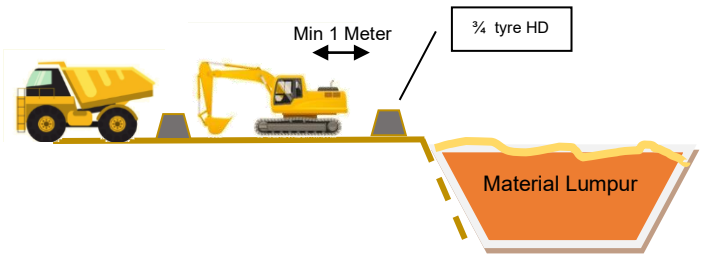
Dibuat Oleh	: **Irwan Adi Putra** **Group Leader**	**Tgl : 01/12/2025**
Ditinjau Oleh	: **Fachrul Latuconsina** **Departement Head**	**Tgl : 01/12/2025**
Disetujui Oleh	: **Wahyu Binuko** **Penanggung Jawab Operational**	**Tgl : 01/12/2025**

CATATAN REVISI

NO.	HALAMAN	URAIAN REVISI	TANGGAL
1.	01	Perubahan template dokumen IK	27 Juli 2023
2.	01	Perubahan template dokumen IK	15 Oktober 2023
3.	01	Perubahan a. Pimpinan Departemen Dari Bpk. Mustofa ke Bpk. Fachrul Latuconsina b. PJO dari Bpk. Handy Sastradi Ke Bpk. Rodli Muhajir	24 Oktober 2024
4.	01	Perubahan a. PJO dari Pak Rodli Muhajir Ke Pak Wahyu Binuko	01 Desember 2025

A. LANGKAH KERJA

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
1.	**Persiapan**	1. Pengawas area front loading lumpur melakukan observasi terlebih dahulu di lokasi loading lumpur apakah ada kondisi tidak aman, dan pengawas area front loading lumpur memastikan kondisi lantai/base kerja keras dan padat sesuai dengan kajian teknis dari tim geotech engineer, serta melengkapi APD tambahan berupa pelampung di setiap unit A2B. Form yang di isi saat observasi ialah : a. Form Check List Daily Activity Loading Lumpur (***PPA-ADRO-F-PRO-13***) b. Form Check List Inspeksi Area Loading Material Lumpur Per 2 Jam (***PPA- ADRO-F-PRO-14***) 2. Melakukan breafing di lokasi loading lumpur ke semua operator yang terlibat sebelum melakukan aktifiktas loading lumpur. 3. Kepengawasan area front loading lumpur bersifat melekat.	Group Leader
2.	**Melakukan Loading Material Lumpur**	1. Loading Lumpur dengan **menggunakan excavator** dan alat angkut loading lumpur menggunakan unit **HD kapasitas 100 ton**, dengan penanganan khusus hingga material lumpur yang di angkut tidak tumpah di jalan. 2. Terdapat **unit support dozer** untuk membantu perapihan base dari material tumpahan excavator , agar area kerja tetap keras, padat , dan relatif datar. 3. Posisikan Excavator di base/ lantai yang keras dengan cara menggunakan bucket, **posisi track melintang dari crest** kolam diawasi langsung oleh pengawas area front loading.  	Group Leader

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
		4. Terdapat **tanggul setinggi ¾ dari diameter tyre HD** yang terbesar atau yang loading pada area front loading lumpur untuk pengamanan area pinggir batas base dan area lumpur. Tempatkan track excavator dengan jarak **minimal 1 meter** dari tanggul yang ada.  	
3	**Teknik Loading**	1. Untuk excavator gunakan **metode single side** dari kabin operator dengan **cara top loading** saat memuat ke unit HD, kecuali untuk case tertentu yang mengharuskan metode side sisi kanan dari kabin operator hauler dengan panduan pengawas area front loading lumpur yang berada di lapangan melalui radio komunikasi. 2. Untuk material lumpur cair bisa menggunakan metode top loading ataupun bench loading dengan ketinggian dudukan untuk track unit loader **minimal 2 meter** dari lumpur. Untuk material lumpur keras bias menggunakan metode bench loading. 3. Jika menggunakan metode **top loading,** maka wajib terdapat stopper berupa tanggul antara unit Excavator dan unit HD.  4. Posisi unit HD pada saat stop untuk loading adalah 0,5 – 1 meter dari tanggul yang ada.	Group Leader

PPA	**PT PUTRA PERKASA ABADI** **INSTRUKSI KERJA**	No. Dokumen : PPA-ADRO-IK-PRO-15 No. Revisi : 04 Edisi : 02 Halaman : 5 of 5 Tgl Terbit : 27 Juli 2023 Tgl Revisi : 01 Desember 2025
	LOADING MATERIAL LUMPUR	
