PPA

PT PUTRA PERKASA ABADI

INSTRUKSI KERJA

DUMPING MATERIAL OVERBURDEN DI AREA KERING


PPA-ADRO-IK-PRO-25



Dibuat Oleh : **Irwan Adi Putra** **Tgl : 01/03/2026**
Group Leader



Ditinjau Oleh : **Fachrul Latuconsina** **Tgl : 01/03/2026**
Departement Head




Disetujui Oleh : **Wahyu Binuko** **Tgl : 01/03/2026**
Penanggung Jawab Operational

PPA	**PT PUTRA PERKASA ABADI** **INSTRUKSI KERJA**	No. Dokumen : PPA-ADRO-IK-PRO-25 No. Revisi : 05 Edisi : 02 Halaman : 2 of 5 Tgl Terbit : 27 Juli 2023 Tgl Revisi : 01 Maret 2026
	DUMPING MATERIAL OVERBURDEN DI AREA KERING	

CATATAN REVISI

NO.	HALAMAN	URAIAN REVISI	TANGGAL
1.	01	Perubahan template dokumen IK	27 Juli 2023
2.	01	Perubahan template dokumen IK	15 Oktober 2023
3.	04	Penambahan point jarak tyre dengan windrow dan posisi dumping limiter	21 Mei 2024
4.	01	Perubahan a. Pimpinan Departemen Dari Mustofa ke Fachrul Latuconsina b. PJO dari Handy Sastradi Ke Rodli Muhajir	24 Oktober 2024
5.	01	Perubahan PJO	01 Desember 2025
6.	01	Perubahan Judul IK , Dan Isi khusus pada dumping material overburden pada area kering	10 Maret 2026

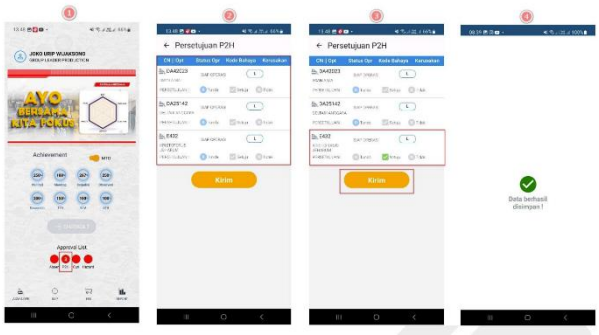No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
1.	**Tujuan**	Instruksi kerja ini bertujuan sebagai acuan dalam melakukan dalam melakukan dumping di area kering	
2.	**Definisi**	- Dumping di area kering adalah kegiatan dumping material dari dump truck ke lokasi disposal, dimana lokasi pembuangannya kering / kondisi normal	
3.	**Persiapan**	a. **Validasi P2H** Pengawas melakukan validasi P2H secara digital untuk unit yang sudah siap untuk dioperasikan.  b. **Inspeksi Area Dumping Di Atas Lumpur** Pengawas melakukan Inspeksi Area Dumping di area kering sebelum dumping di atas lumpur bisa dimulai, meliputi : - Windrow minimal 1/3 ban unit terbesar yang melakukan dumping pada area disposal. - Terpasang Grade Box - Telah Terpasang Dumping Limiter (Tiang Acuan Dumping berbendera dengan tinggi 3-4 Meter. - Untuk pekerjaan di malam hari pastikan penerapan tersedia dan memadai. - Pita acuan luasan disposal terpasang dan terlihat jelas	
4.	**Pelaksanaan**	a. Dumptruck memasuki area dumping yang telah ditentukan (dibatasi acuan dumping), dan melakukan manuver searah jarum jam.	

		b. Dumping material dilakukan secara teratur atau sesuai arahan dari pengawas area. c. Lakukan penimbunan perlayer, maksimal tinggi penimbunan 6 meter. d. Jarak dumping dengan crestline minimal 4 meter, atau sesuai rekomendasi geotek e. Operator memastikan tidak ada unit dibelakangnya sebelum mundur. f. Mundurkan DT sejajar dengan batas tiang acuan dumping (batas acuan dumping di pasang 10 meter dari crest) dan tumpahkan material. g. Setelah dumping turunkan vessel , dan menuju ke front melalui jalan yang sudah ditentukan h. Jarak dumping anatar DT minimal 1 kali lebar unit DT yang melakukan dumping i. Unit Support Dozer memastikan dumping area selalu terjaga windrow , kemiringan disposal sehingga memudahkan proses dozing. j. Jika ditemukan retakan, hentikan kegiatan dan berkoordinasi dengan tim perencanaan tau koordinator pengawas untuk segera dilakukan perbaikan.	
5.	**Tahap Akhir**	a. Pengawas memastikan semua unit support atau unit yang berada di area disposal parkir dilokasi yang aman, sebelum unit ditinggalkan.	

PPA	**PT PUTRA PERKASA ABADI** **INSTRUKSI KERJA**	No. Dokumen : PPA-ADRO-IK-PRO-25 No. Revisi : 05 Edisi : 02 Halaman : 5 of 5 Tgl Terbit : 27 Juli 2023 Tgl Revisi : 01 Maret 2026
	DUMPING MATERIAL OVERBURDEN DI AREA KERING	

Lampiran

