PPA

PT PUTRA PERKASA ABADI

INSTRUKSI KERJA

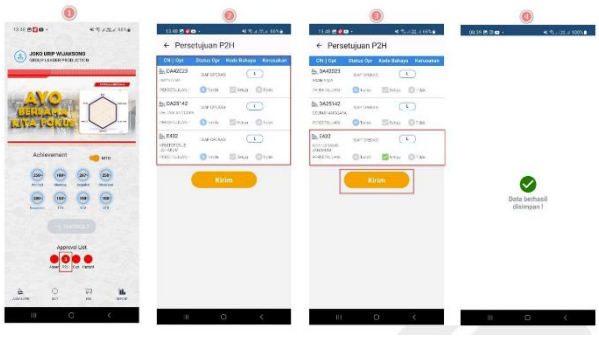
DUMPING DI ATAS AIR

PPA-ADRO-IK-PRO-29

Dibuat Oleh	:	**Irwan Adi Putra** **Group Leader**	**Tgl : 10/03/2026**
Ditinjau Oleh	:	**Fachrul Latuconsina** **Departement Head**	**Tgl : 10/03/2026**
Disetujui Oleh	:	**Wahyu Binuko** **Penanggung Jawab Operational**	**Tgl : 10/03/2026**

CATATAN REVISI

NO.	HALAMAN	URAIAN REVISI	TANGGAL
1.	01	Perubahan template dokumen IK	27 Juli 2023
2.	01	Perubahan template dokumen IK	15 Oktober 2023
3.	01	Perubahan a. Pimpinan Departemen Dari Mustofa ke Fachrul Latuconsina b. PJO dari Handy Sastradi Ke Rodli Muhajir	24 Oktober 2024
4.	04	Penambahan rekomendasi geotek terkait jarak dumping	09 Oktober 2025
5.	05	Perubahan PJO	01 Desember 2025
6.	03	Perubahan Acuan Dumping	10 Maret 2026

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
1.	**Tujuan**	Instruksi kerja ini bertujuan sebagai acuan dalam melakukan dalam melakukan dumping di atas air	
2.	**Definisi**	- Dumping diatas air adalah kegiatan dumping material dari dump truck ke lokasi disposal, dimana lokasi pembuangannya terisi oleh genangan air dengan kedalaman maksimal ≥ 0.6 m. - Dumping Diatas lumpur masuk kedalam kategori pekerjaan HIGH RISK dan Berlaku ketentuan Wajib dilakukan Inspeksi Per 2 Jam dan Pengawasan Melekat.	
3.	**Persiapan**	a. **Validasi P2H** Pengawas melakukan validasi P2H secara digital untuk unit yang sudah siap untuk dioperasikan.  b. **Inspeksi Area Dumping Di Atas Lumpur** Pengawas melakukan Inspeksi Area Dumping di Atas Lumpur sebelum dumping di atas lumpur bisa dimulai, meliputi : - Windrow minimal 1/3 ban unit terbesar yang melakukan dumping pada area disposal. - Tinggi air sisa maksimal 0.5 m yang terjebak pada area lumpur. - Terpasang Grade Box - Pad Dumping minim undulasi dan terawat dengan baik. - Telah Terpasang Dumping Limiter (Tiang Acuan Dumping berbendera dengan tinggi 3-4 Meter.	

		- Untuk pekerjaan di malam hari pastikan penerapan tersedia dan memadai.	
4.	**Pelaksanaan**	a. Dumptruck memasuki area dumping yang telah ditentukan (dibatasi acuan dumping), dan melakukan manuver searah jarum jam. b. Dumping material dilakukan secara teratur atau sesuai arahan dari pengawas area. c. Lakukan penimbunan perlayer, maksimal tinggi penimbunan 3 meter diatas lumpur atau air d. Jarak dumping dengan crestline minimal 20 meter, atau sesuai rekomendasi geotek e. Operator memastikan tidak ada unit dibelakangnya sebelum mundur. f. Mundurkan DT sejajar dengan batas tiang acuan dumping (batas acuan dumping di pasang 26 meter dari crest) dan tumpahkan material. g. Setelah dumping turunkan vessel , dan menuju ke front melalui jalan yang sudah ditentukan h. Jarak dumping anatar DT minimal 1 kali lebar unit DT yang melakukan dumping i. Unit Support Dozer memastikan dumping area selalu terjaga windrow , kemiringan disposal sehingga memudahkan proses dozing. j. Pengawas Melekat pada area ini, dan dilakukan Inspkesi per 2 Jam k. Jika ditemukan retakan, hentikan kegiatan dan berkoordinasi dengan tim perencanaan tau koordinator pengawas untuk segera dilakukan perbaikan.	
5.	**Tahap Akhir**	a. Pengawas memastikan semua unit support atau unit yang berada di area disposal parkir dilokasi yang aman, sebelum unit ditinggalkan.	

A. Lampiran

